

# 甲州市環境センターごみ処理施設解体工事進捗状況

■管理棟、車庫棟解体状況工場棟、管理区域養生仮設設置状況

( 令和 3年 6月 )

②～⑧


管理棟及び車庫棟に解体養生足場を設置し上屋解体作業を行いました。手作業での内部解体後、重機による上屋（躯体）の解体作業を行いました。

⑨～⑫

工場棟に接続した解体ヤード（管理区域）の設置を行いました。はじめに土間コンクリートを打設し、汚染物が土壌へ浸透することを防ぎます。その上に鋼管製の足場を組み上げ、屋根を掛けて耐久性の強い養生シートで全面を覆います。密閉養生した解体ヤード内で重機での解体作業を行うことで、汚染物の外部への流出を防ぎます。

⑬～⑯

管理区域からの作業員の出入口にクリーンルームを設置し、工場棟内部の汚染物の除去を行っています。管理区域から戻ってきた作業員は、クリーンルーム内でエアシャワー、靴拭きマット等を使用し、保護具に付着した汚染物をきれいに除去します。除去後、クリーンルーム内で保護具を脱ぎます。管理区域へ出入りする際に毎回行うことで汚染物の外部への流出を防ぎます。

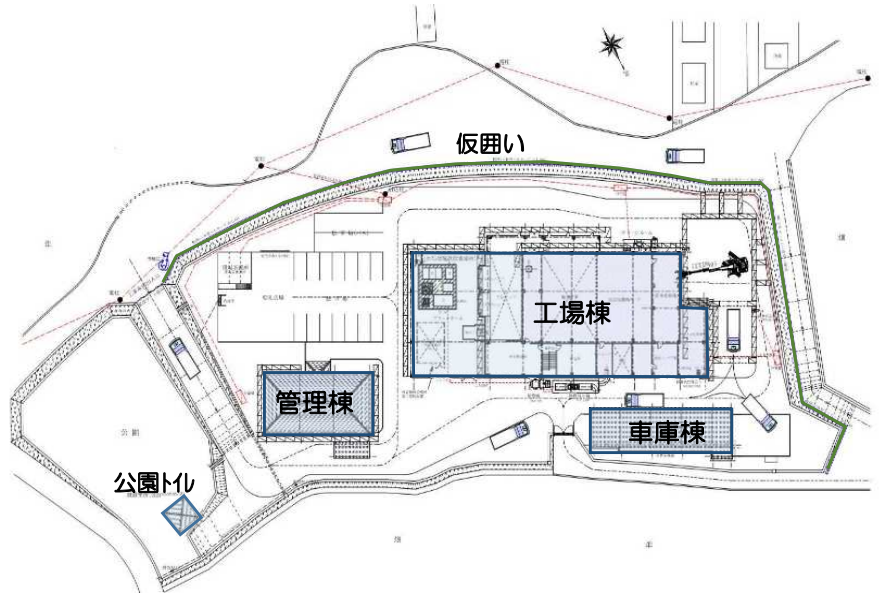

① 全景 (2021.6.30)



② 管理棟 解体養生足場組立



③ 管理棟 養生シート張り



④ 管理棟 内部解体状況





⑤ 管理棟 上屋解体状況



⑥ 管理棟 上屋解体状況



⑦ 車庫棟 上屋解体状況



⑧ 車庫棟 上屋解体状況



⑨ 工場棟 解体ヤード土間コンクリート打設



⑩ 工場棟 解体ヤード養生足場組立





⑪ 工場棟 解体ヤード屋根トラス設置状況



⑫ 工場棟 解体ヤード組立状況



⑬ 工場棟 クリーンルーム設置状況



⑭ 工場棟 クリーンルーム設置状況



⑮ 工場棟 汚染物除去（灰出し）状況



⑯ 工場棟 汚染物除去（高圧洗浄）状況
