

甲州市環境センターごみ処理施設解体工事進捗状況

■工場棟 設備機器解体・2次除染状況（管理区域内）

（ 令和 3年 9月 ）

②～⑦

先月から引き続き、管理区域である工場棟を密閉養生し、設備機器の解体作業を行いました。工場棟の建物躯体（鉄骨、壁、屋根）以外の設備機器等を解体後、建屋内部の2次除染作業を行います。

⑧～⑪


工場棟の設備機器解体後、建屋内部及び管理区域の2次除染作業を行いました。

⑫～⑮

建屋内部及び管理区域の2次除染作業後、除染状況の確認、作業環境測定を行いました。作業環境測定でダイオキシン類の除去を確認後、密閉養生された管理区域の撤去を行います。

⑯

工場棟外部に防音及び粉じん飛散防止のため、養生足場の組立を行っています。養生足場組立後、工場棟の建屋解体に移ります。

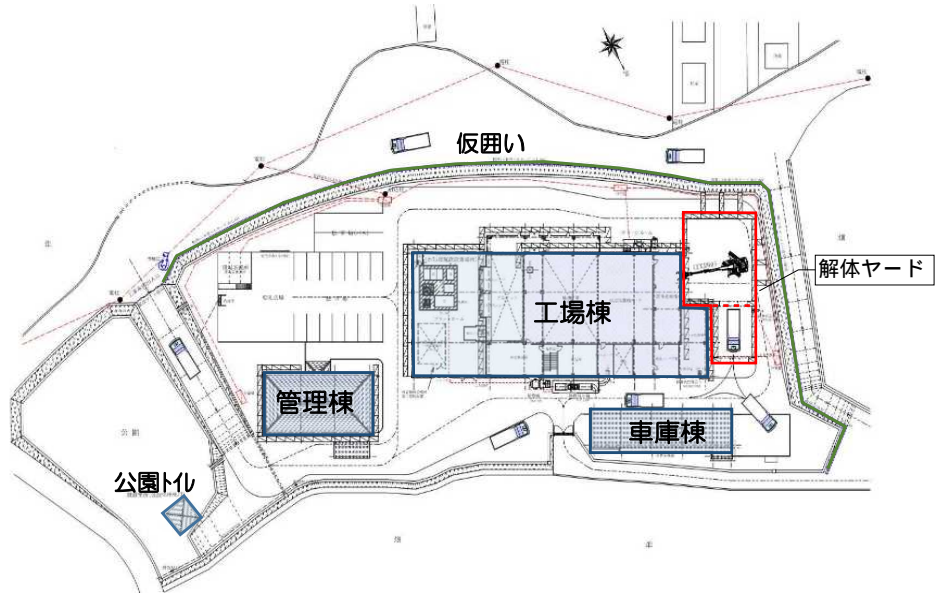

① 全景（2021.9.30）



② 工場棟 設備機器解体状況



③ 工場棟 設備機器解体状況



④ 工場棟 設備機器解体状況



⑤ 工場棟 設備機器解体状況（耐火レンガ洗浄）



⑥ 工場棟 設備機器解体状況



⑦ 工場棟 設備機器解体状況



⑧ 工場棟 2次除染状況（解体ヤード）



⑨ 工場棟 2次除染状況（工場棟内壁）



⑩ 工場棟 2次除染状況（工場棟内壁）



⑪ 工場棟 2次除染状況（トラックヤード）




⑫ 工場棟 2次除染確認作業



⑬ 工場棟 2次除染確認作業



⑭ 管理区域 作業環境測定（ダイオキシン類）

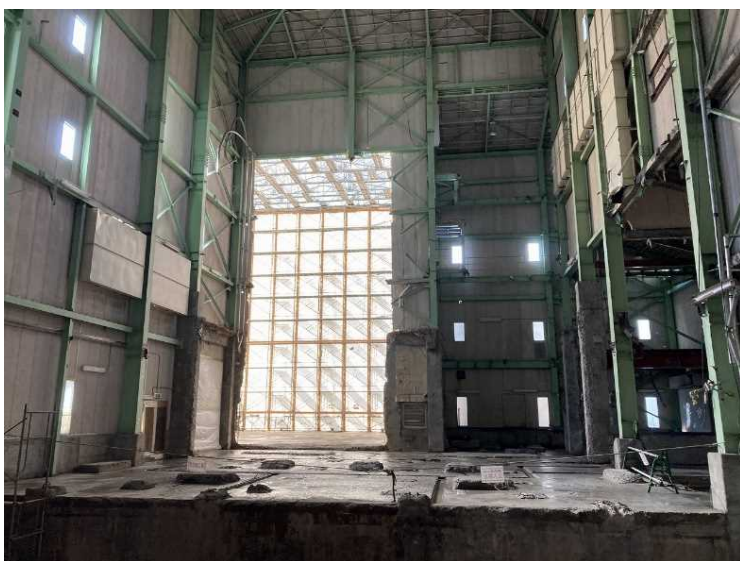

⑮ 管理区域 2次除染完了



⑯ 工場棟 養生足場組立状況

ダイオキシン類の除染工事については、管理区域内の2次除染作業が完了し、作業環境測定を行った結果、基準値の範囲内であったため、次工程の工場棟の解体に着手していきます。
